N°	Task Name	Durée
1	**Programme New DC BNP Paribas**	**680 jours**
2		
3	**Phase Programmation / Concept industriel / Livre des Normes**	**125 jours**
4	Définition architecturale, Analyse fonctionnelle, Concept technique e	60 jours
5	Livre des normes: définition des concepts normatifs, des études dét	60 jours
6	Dépôt PC, ICPE	5 jours
7	Validation phase programmation	0 jour
8		
9	**Phase DCE / ACT**	**220 jours**
10	Définition et assistance à la rédaction des contrats de travaux	60 jours
11	Préparation des DCE	30 jours
12	Consultation	30 jours
13	ACT: Analyse des offres et assistance à la sélection des entrprises	40 jours
14	OS démarrage	0 jour
15		
16	**Phase Construction**	**400 jours**
17	Etudes EXE, Synthèse, Visa	120 jours
18	PC + recours purgés + Autorisation ICPE	0 jour
19	Construction TCE	360 jours
20	Exécution Essais Niveau 3	50 jours
21	TCE Hands Off	0 jour
22		
23	**Commisioning - Recette**	**620 jours**
24	Définition	60 jours
25	Préparation Niveaux 4 et 5	40 jours
26	Exécution Niveaux 4 et 5	50 jours
27	Recette	10 jours
28	Validation recette	0 jour

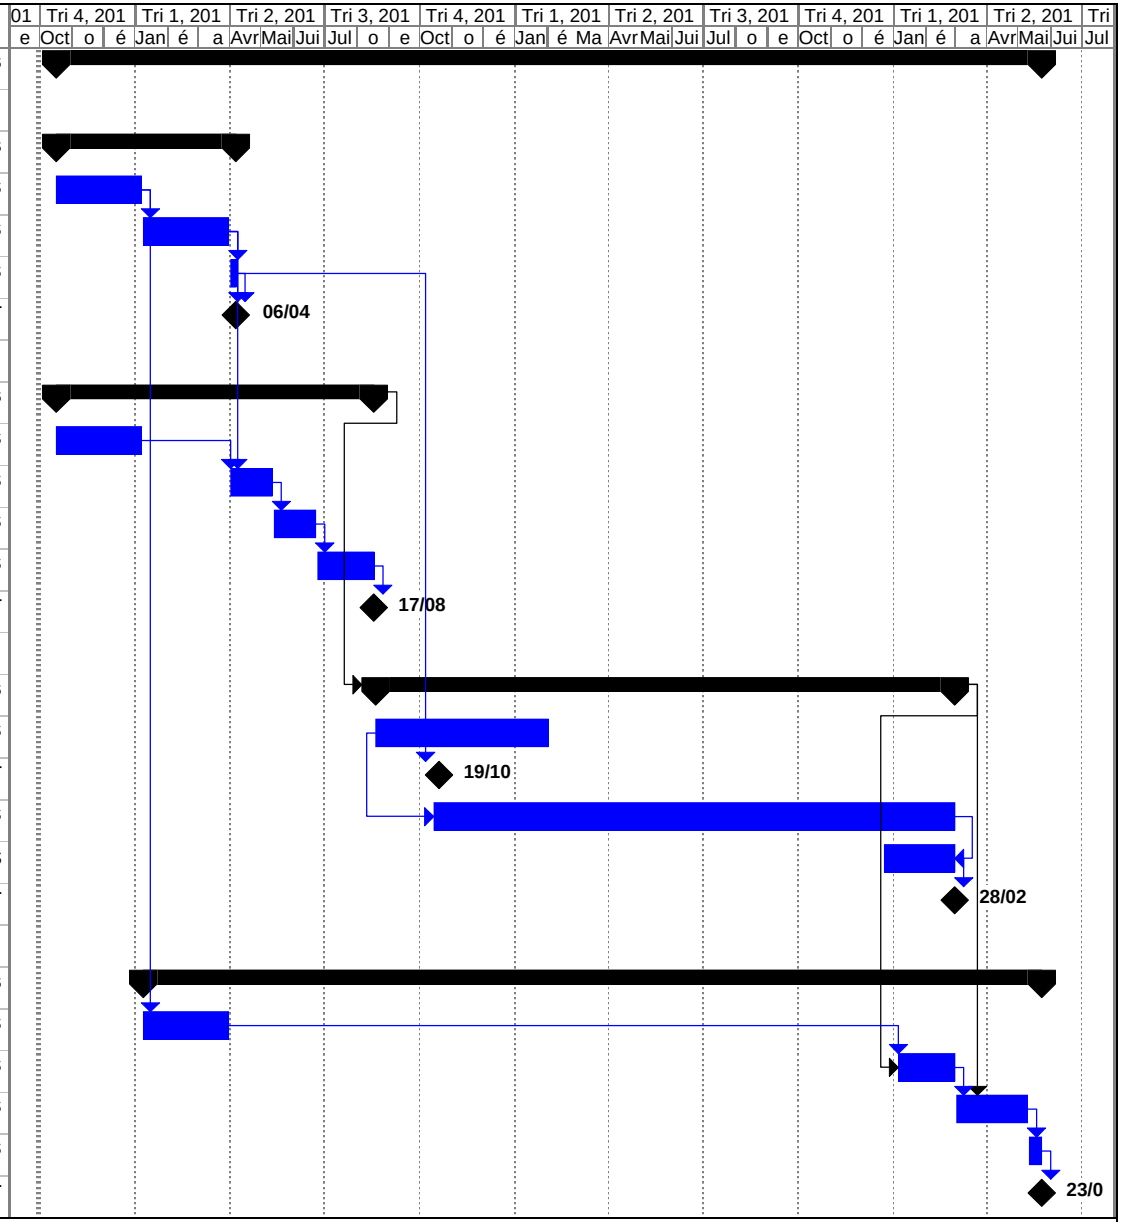

Project: MPP New DC BNPP v0.1
Date: Mer 28/09/11

Task		Milestone		External Tasks	
Split		Summary		External Milestone	
Progress		Project Summary		Deadline	
